

DOPRAVNÍ OMEZENÍ



stavba: Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně

v termínu: leden-březen 2026

místo realizace: křižovatka ulic 2. května x Sokolská

Křižovatka č. 11 – křižovatka ul. 2. května x Sokolská:

Termín zahájení prací na modernizaci křižovatky bude upřesněn podle počasí, přičemž předpoklad je v období leden-březen 2026. **Celá akce by měla trvat přibližně šest až osm týdnů.**

Po dobu stavebních prací bude silniční provoz omezen vypnutím stávajícího světelného signalizačního zařízení. Náhradou bude nahrazeno dočasným SSZ, které bude pracovat v režimu plného signálu a dočasné dopravní značení informující o probíhajících pracích a vymezení pracovních míst značkami Z4.

Na ul. 2. května bude zřízeno pracovní místo osazené ploty, které bude ošetřeno osazením DZ s uvedenou platností min. 7 dní předem.

Stávající přechody pro chodce na sil. II/490 ul. Sokolská a 2. května budou dočasně zrušeny, přičemž pohyb chodců bude zajištěn nově zřízeným provizorním přechodem. Chodci budou vedeni po pěších koridorech.

V rámci pravidelných jízdních řádů veřejné dopravy je nutné počítat s možnou časovou prodlevou.

Konkrétní situace na stránkách SMZ, sekce Odbor dopravy MMZ, „**mapa uzavírek**“


Upozorňujeme, že stavební práce mohou být upravovány podle aktuálních klimatických podmínek a dalších provozních či technických okolností, které nelze předem ovlivnit.

Děkujeme za pochopení.

Investor: Statutární město Zlín

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Diagram illustrating a temporary work area (Krátkodobé pracovní místo) for material unloading and loading (Materiálů, demontáž a osazení sloupů, ATP.). The diagram shows a red rectangular area representing the work zone, situated between two parallel lines. The width of the work zone is labeled as "min. 3,00 m". The length of the work zone is labeled as "délka úseku do 20 m". Arrows indicate the direction of traffic flow, showing a one-way system with a turning lane.

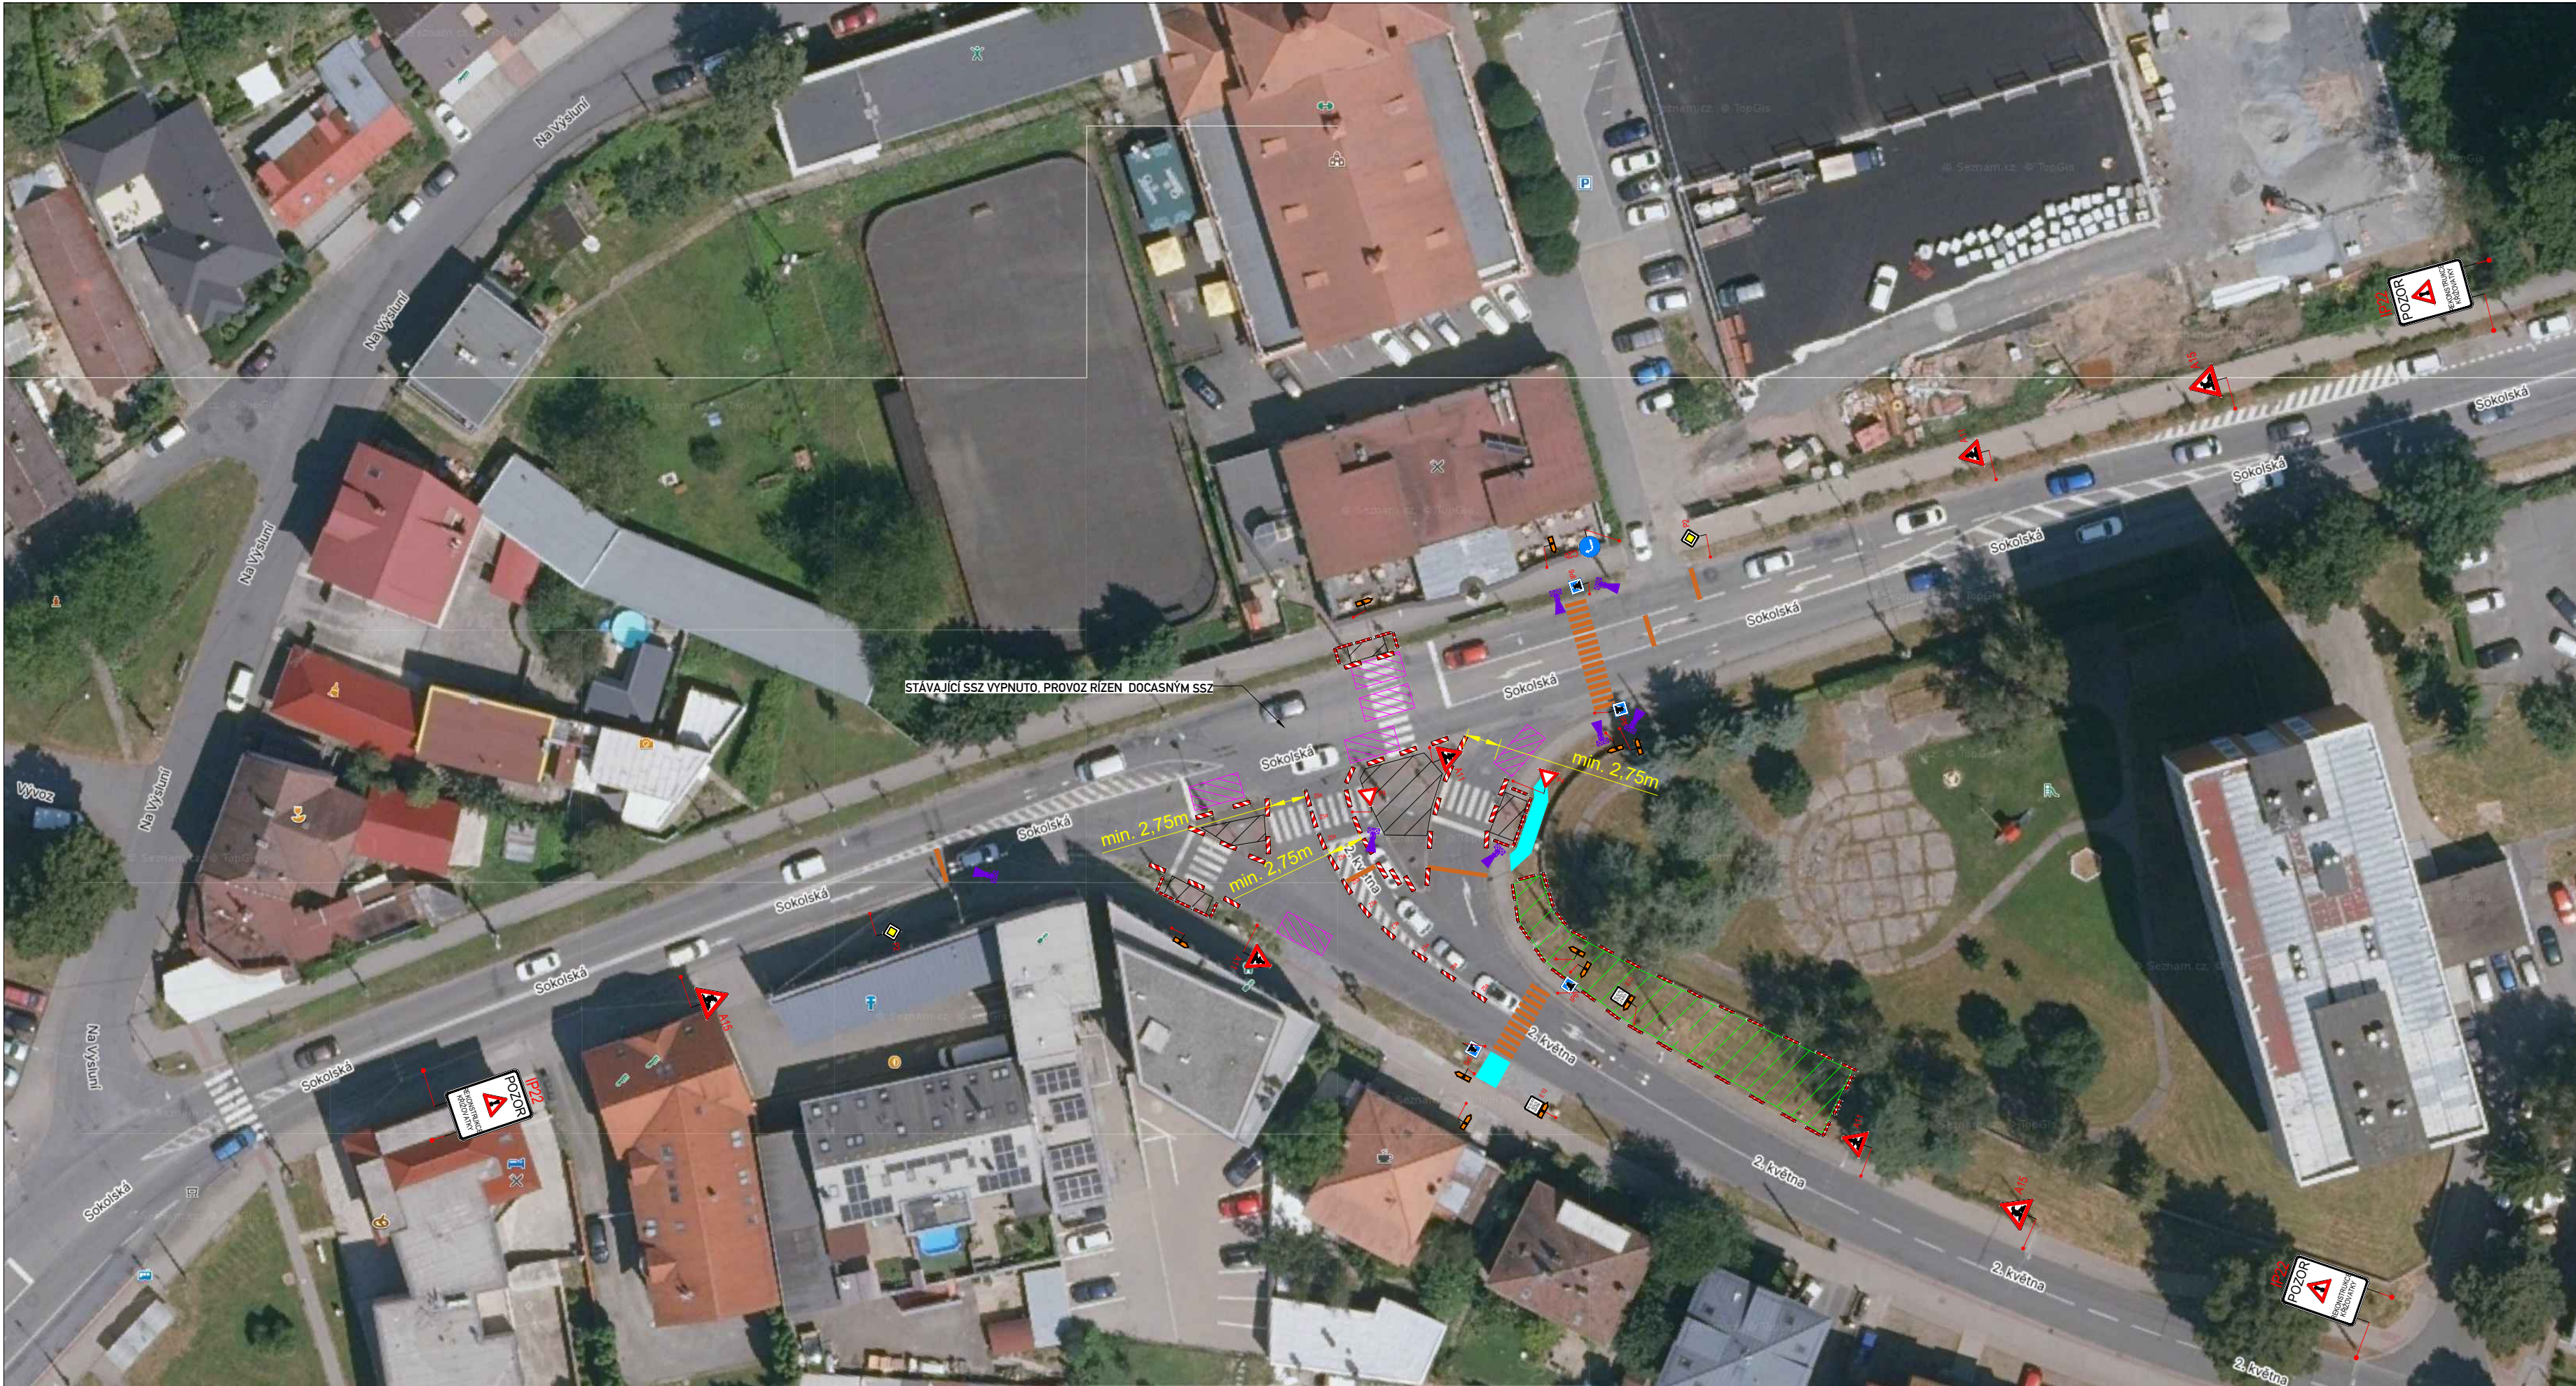

LEGENDA:

	A15	STÁVAJÍCÍ DOPR.ZN.
	A15	DOČASNÉ DOPR.ZN.
		PRACOVNÍ MÍSTA-VÝKOPY S PŘÍPADNÝM ULOŽENÍM VÝKOPKU, SLOŽENÍ NÍZKÉHO MATERIÁLU. BEZ RIZIKA ŠPATNÝCH ROZHLEDOVÝCH POMĚŘŮ
		ZÁBOR PRO ZÁZEMÍ STAVBY, UNIMO BUŇKY, ULOŽENÍ VYŠŠÍHO MATERIÁLU.
		KRÁTKODOBÉ PRACOVNÍ MÍSTO (SLOŽENÍ A NALOŽENÍ MATERIÁLU, DEMONTÁŽ A OSAZENÍ SLOUPŮ, ATP.) PROVOZ ŘÍZEN POUČENOU OSOBOU. VŽDY POUZE JEDNO PRAC.MÍSTO.
		PROVIZORNÍ OBCHŮZÍ TRASY - ZPEVNĚNÁ PLOCHA RECYKLÁTEM, BET. PANELY, ATP.
		PROVIZORNÍ VODOROVNÉ DOPR.ZNAČENÍ - VYZNAČENY POUZE OKRAJE PROVIZORNÍ PÁSKOU
		PROVIZORNÍ SSZ

OBJEDNATEL: CROSS Zlín, a.s.

NÁZEV ZAKÁZKY: **INOVACE V ROZVOJI ŘÍZENÍ DOPRAVY
S VYUŽITÍM PRVKŮ C2X VE MĚSTĚ ZLÍN**

NÁZEV OBJEKTU: **PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU**

NÁZEV VÝKRESU: **11 - 2. května x Sokolská**

